

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców poprzez odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych dzięki budowie, modernizacji i doposażeniu istniejącej infrastruktury na terenie aglomeracji Złotoryja. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 302 958,00 zł natomiast kwota dofinansowania to 22 443 606,27 zł. W ramach projektu realizowanych jest osiem zadań rzeczowych:

### **Zadanie 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków**

Dotychczas Wykonawca dokonał wyburzenia pompowni osadu nadmiernego, zbiornika Imhoffa oraz magazynu piasku. Ponadto przebudowie poddano blok biologicznego oczyszczania ścieków (blok A), a także komórę zasuw. Co więcej na terenie oczyszczalni ścieków powstały nowe obiekty tj. komory tlenowej stabilizacji, komora rozdzielcza, fundament pod agregat prądowładczy, stacja dawkowania i magazynowania PIX, pompownia czyszczyk i studzienka czyszczakowa.

W chwili obecnej modernizowane są m.in. obiekty tj. budynek krat i piaskowników, budynek odwadniania osadów, place składowania osadu odwodnionego, budynek stacji transformatorowej, osadnik wtórny oraz budynek dmuchaw.


Zakończenie inwestycji nastąpi do dnia 11.02.2019 r.

### ***Blok biologicznego oczyszczania ścieków (blok A)***





***Komora tlenowej stabilizacji***

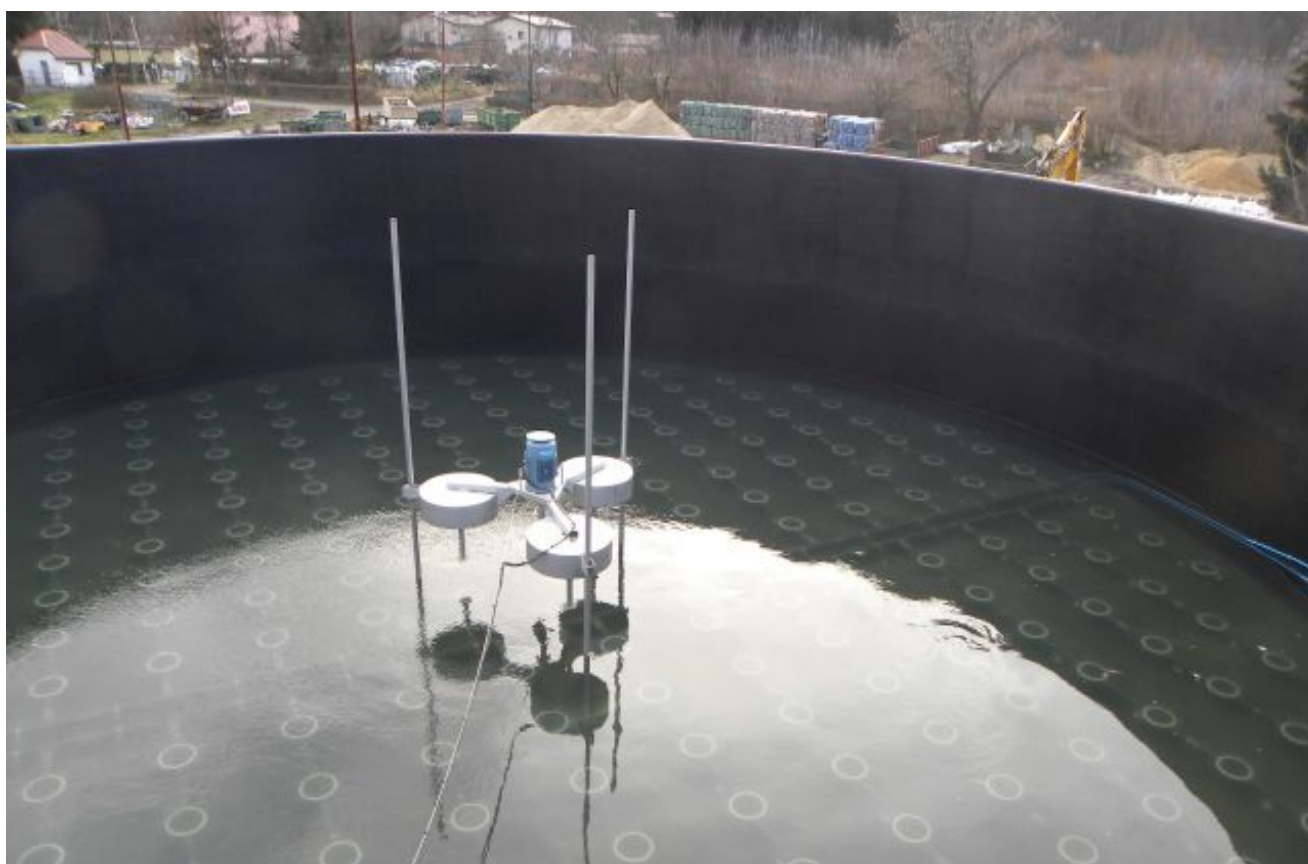

***Budynek krat i piaskowników***



***Budynek odwadniania osadów***



***Place składowania osadu odwodnionego***



***Osadnik wtórny***



### **Zadanie 2 – Modernizacja pompowni ścieków**

Wszczęcie postępowania przetargowego planuje się na przełomie I i II kwartału 2018 r.

### **Zadanie 3 – Zakup ładowarki**

Wszczęcie postępowania przetargowego planuje się w II kwartale 2018 r.

### **Zadanie 4 – Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej**

Wybudowano 262,8 m nowej sieci kanalizacji sanitarnej tj. 109,5m w ul. Polnej oraz 153,3m w ul. Nowowiejskiej.

Rozpoczęcie prac w ul. Kamiennej i w ul. Malinowej planuje się w III kwartale 2018 r. Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący ul. Malinowej został opracowany przez firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski.

### **Zadanie 5 – Modernizacja istniejącej sieci sanitarnej**

---

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego planuje się w II kwartale 2018 r. natomiast w ul. Staromiejskiej w III kwartale 2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący ul. Krzywoustego został opracowany przez firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych mgr inż. Bartłomiej Dębrowski.

### Zadanie 6 – Zakup pojazdu specjalistycznego

W grudniu 2017 r. firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. dostarczyła pojazd specjalistyczny (samochód kombinowany) przeznaczony do ciśnieniowego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych. Pojazd wyposażony jest w zestaw sprzętu do inspekcji wizualnej kanalizacji umożliwiający bezwykopowe określenie przyczyny występowania zatoru w sieci.

#### ***Pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych***



### Zadanie 7 – Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni Z-3

Instalacja elektrowni fotowoltaicznej planuje się zamontować na pompowni Z-3. W tym celu Zakład Projektowo-Wykonawczy Tadeusz Kos opracował projekt budowlano-wykonawczy.

### **Zadanie 8 – Dostawa i montaż systemu GIS**

Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez firmę Krzysztof Bączut „IBTECH” Przedsiębiorstwo Techniki Instalacyjnej i Budowlanej przygotowano dokumentację przetargową.

Wszczęcie postępowania przetargowego planuje się w I kwartale 2018 r.
