

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców poprzez odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych dzięki budowie, modernizacji i doposażeniu istniejącej infrastruktury na terenie aglomeracji Złotoryja. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 302 958,00 zł natomiast kwota dofinansowania to 22 443 606,27 zł. W ramach projektu realizowanych jest osiem zadań rzeczowych:

Zadanie 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków

Dotychczas Wykonawca dokonał wyburzenia pompowni osadu nadmiernego, zbiornika Imhoffa oraz magazynu piasku. Ponadto przebudowie poddano blok biologicznego oczyszczania ścieków (blok A), a także komorę zasuw. Co więcej na terenie oczyszczalni ścieków powstały nowe obiekty tj. komory tlenowej stabilizacji, komora rozdzielcza, fundament pod agregat prądowładzy, stacja dawkowania i magazynowania PIX, pompownia czyszcząca piływających i studzienka czyszczakowa.

W chwili obecnej modernizowane są m.in. obiekty tj. budynek krat i piaskowników, budynek odwadniania osadów, place składowania osadu odwodnionego, budynek stacji transformatorowej, osadnik wtórny oraz budynek dmuchaw.


Zakończenie inwestycji nastąpi do dnia 11.02.2019 r.

Blok biologicznego oczyszczania ścieków (blok A)





Komora tlenowej stabilizacji

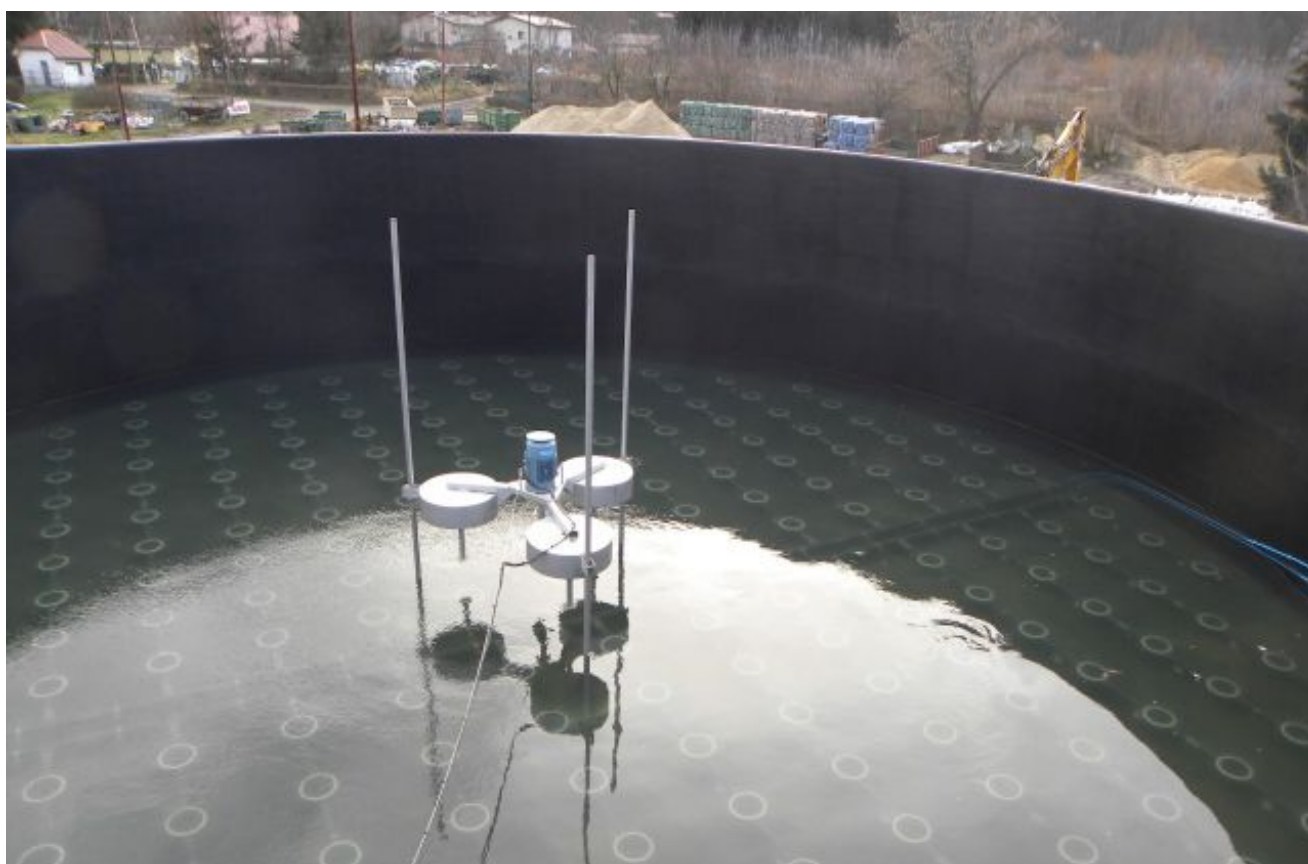

Budynek krat i piaskowników



Budynek odwadniania osadów



Place składowania osadu odwodnionego



Osadnik wtórny



Zadanie 2 – Modernizacja pompowni ścieków

Wszczęcie postępowania przetargowego planuje się na przełomie I i II kwartału 2018 r.

Zadanie 3 – Zakup ładowarki

Wszczęcie postępowania przetargowego planuje się w II kwartale 2018 r.

Zadanie 4 – Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Wybudowano 262,8 m nowej sieci kanalizacji sanitarnej tj. 109,5m w ul. Polnej oraz 153,3m w ul. Nowowiejskiej.

Rozpoczęcie prac w ul. Kamiennej i w ul. Malinowej planuje się w III kwartale 2018 r. Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący ul. Malinowej został opracowany przez firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski.

Zadanie 5 – Modernizacja istniejącej sieci sanitarnej

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego planuje się w II kwartale 2018 r. natomiast w ul. Staromiejskiej w III kwartale 2018 r.

Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący ul. Krzywoustego został opracowany przez firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski.

Zadanie 6 – Zakup pojazdu specjalistycznego

W grudniu 2017 r. firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. dostarczyła pojazd specjalistyczny (samochód kombinowany) przeznaczony do ciągłego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych. Pojazd wyposażony jest w zestaw sprzętu do inspekcji wizualnej kanalizacji umożliwiający bezwykopowe określenie przyczyny występowania zatoru w sieci.

Pojazd specjalistyczny do ciągłego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych



Zadanie 7 – Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni Z-3

Instalacja elektrowni fotowoltaicznej planuje się zamontować na pompowni Z-3. W tym celu Zakład Projektowo-Wykonawczy Tadeusz Kłos opracował projekt budowlano-wykonawczy.

Zadanie 8 – Dostawa i montaż systemu GIS

Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez firmę Krzysztof Bączut „IBTECH” Przedsiębiorstwo Techniki Instalacyjnej i Budowlanej przygotowano dokumentację przetargową.

Wszczęcie postępowania przetargowego planuje się w I kwartale 2018 r.
